

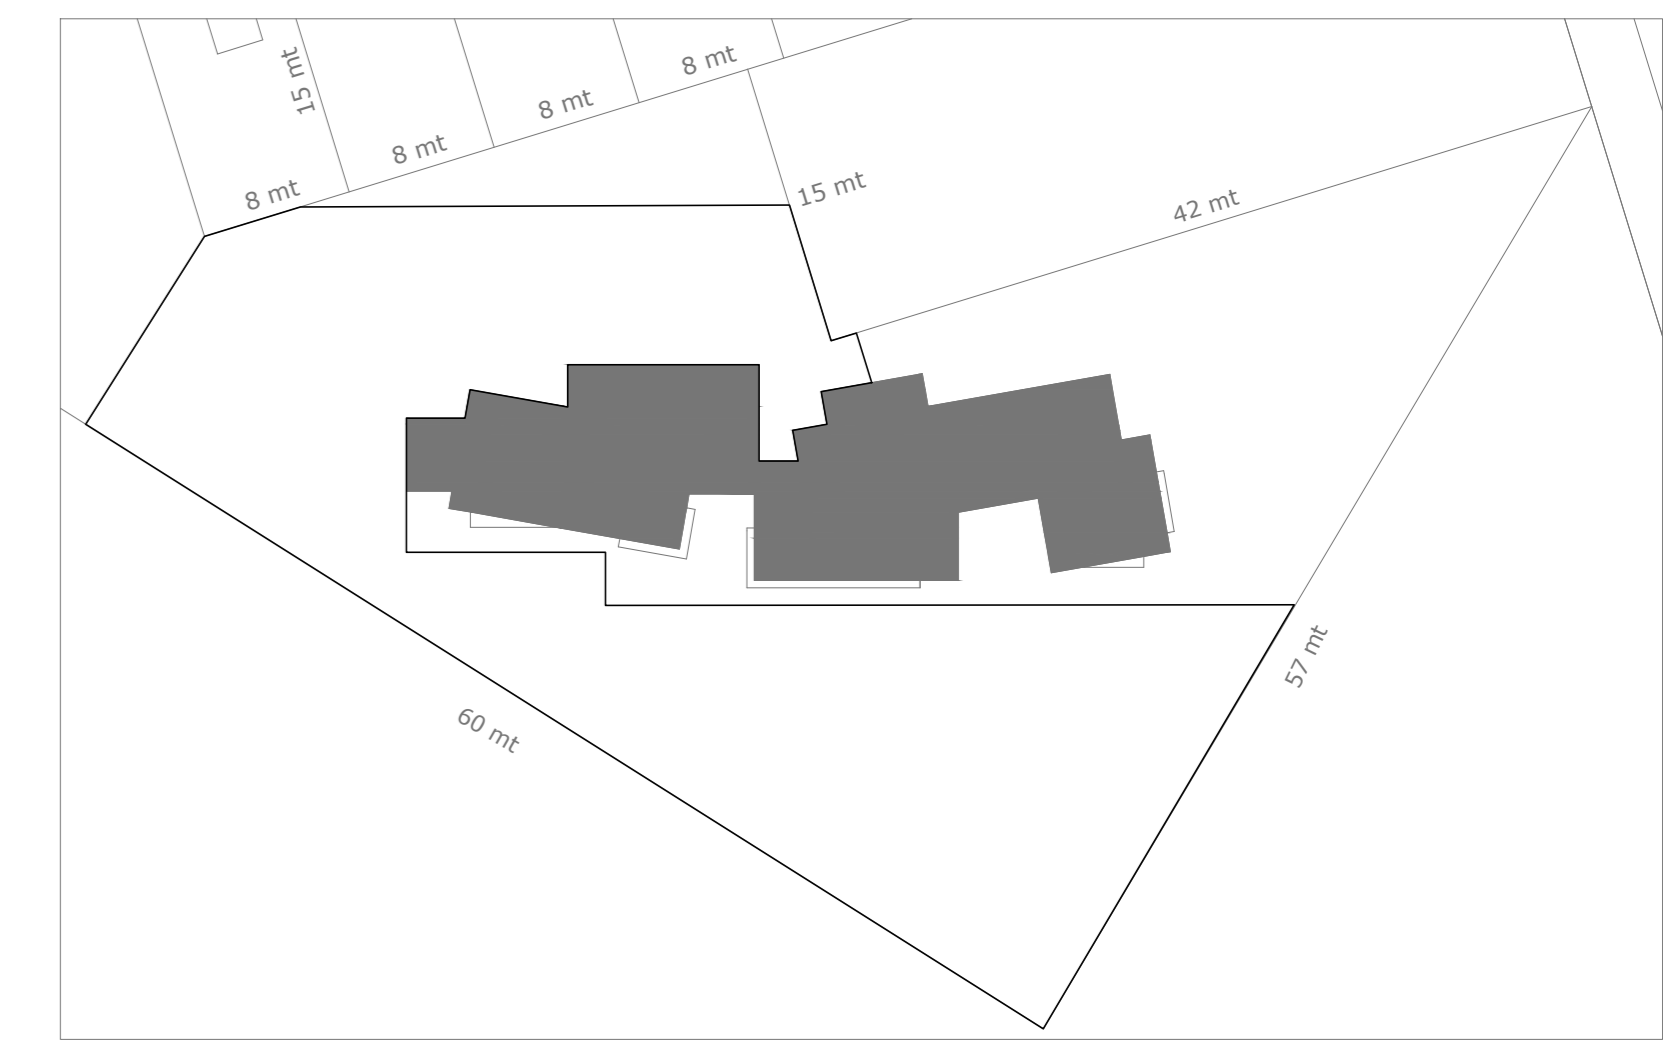


PARTIDAS

- Mediante el presente la Unidad de Planificación, Proyectos y Recursos Físicos se permiten manifestar lo siguiente:
- Que de acuerdo a la información recibida nuestra comunidad educativa se encuentra en conocimiento del Proyecto de Conservación del Establecimiento que se ha presentado a la Dirección de Educación Pública, manifestando nuestra conformidad con él.
- De acuerdo a las obras a realizar estas no intervienen en la atención de los menores ya que se trata de reponer ventanas de maderas por ventanas de aluminio, las que primeramente son fabricadas y una vez que estén listas, se procede al retiro de las existentes al desarme del tabique, por lo que en esta etapa no se afecta la atención de menores.
- Al realizarse el desarme de la estructura de muro se realizará por etapas, primeramente en sala de multiuso, donde los alumnos se mantendrán en aula de atención, para lo cual se solicita que se comiencen a realizar las obras el día Viernes, continuar sábado, domingo y lunes, des esta forma el día martes ya estará repuesto el muro, pudiéndose trasladar los menores del nivel de sala cuna a la sala de multiuso, para proceder a intervenir el muro y ventana del nivel de sala cuna, realizando el mismo procedimiento anterior.
- Las pinturas, terminaciones barnices interiores, se realizarán con posterioridad a que este repuesto el muro, instaladas las ventanas, comenzando el día viernes en la tarde, concluir el sábado y que el Lunes se encuentre en condiciones de funcionar.
- Los revestimientos exteriores, pintura exteriores, sellos, hojalaterías, terminaciones se realizarán con posterioridad a las intervenciones interiores, protegiendo las ventanas, para así no afectar a los menores y que estos no mantengan contacto visual con los trabajadores.
- Todos los sectores que están siendo intervenidos se aislarán con malla rachel o planchas de OSB, para evitar el contacto con alumnos, como así la instalación de debida señalética.
- Por otro lado la Unidad de Planificación, Proyectos y Recursos Físicos, Previsionista de Riesgos de la Corporación Municipal y el establecimiento coordinarán con la empresa, los trabajos a ejecutar, programación, plan de mitigación, jornadas de trabajo en interiores, medidas de seguridad correspondientes, aislamiento de las zonas a intervenir, señalética, con el objetivo de facilitar y permitir concretar la ejecución del Proyecto de Conservación sin alterar el funcionamiento de nuestro establecimiento y sin afectar la seguridad de estudiantes y funcionarios.

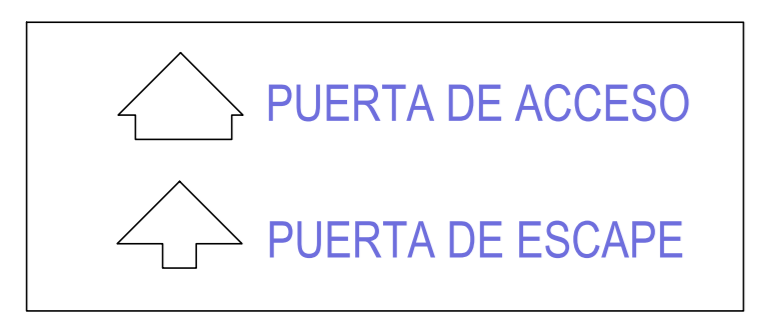

UBIGACION

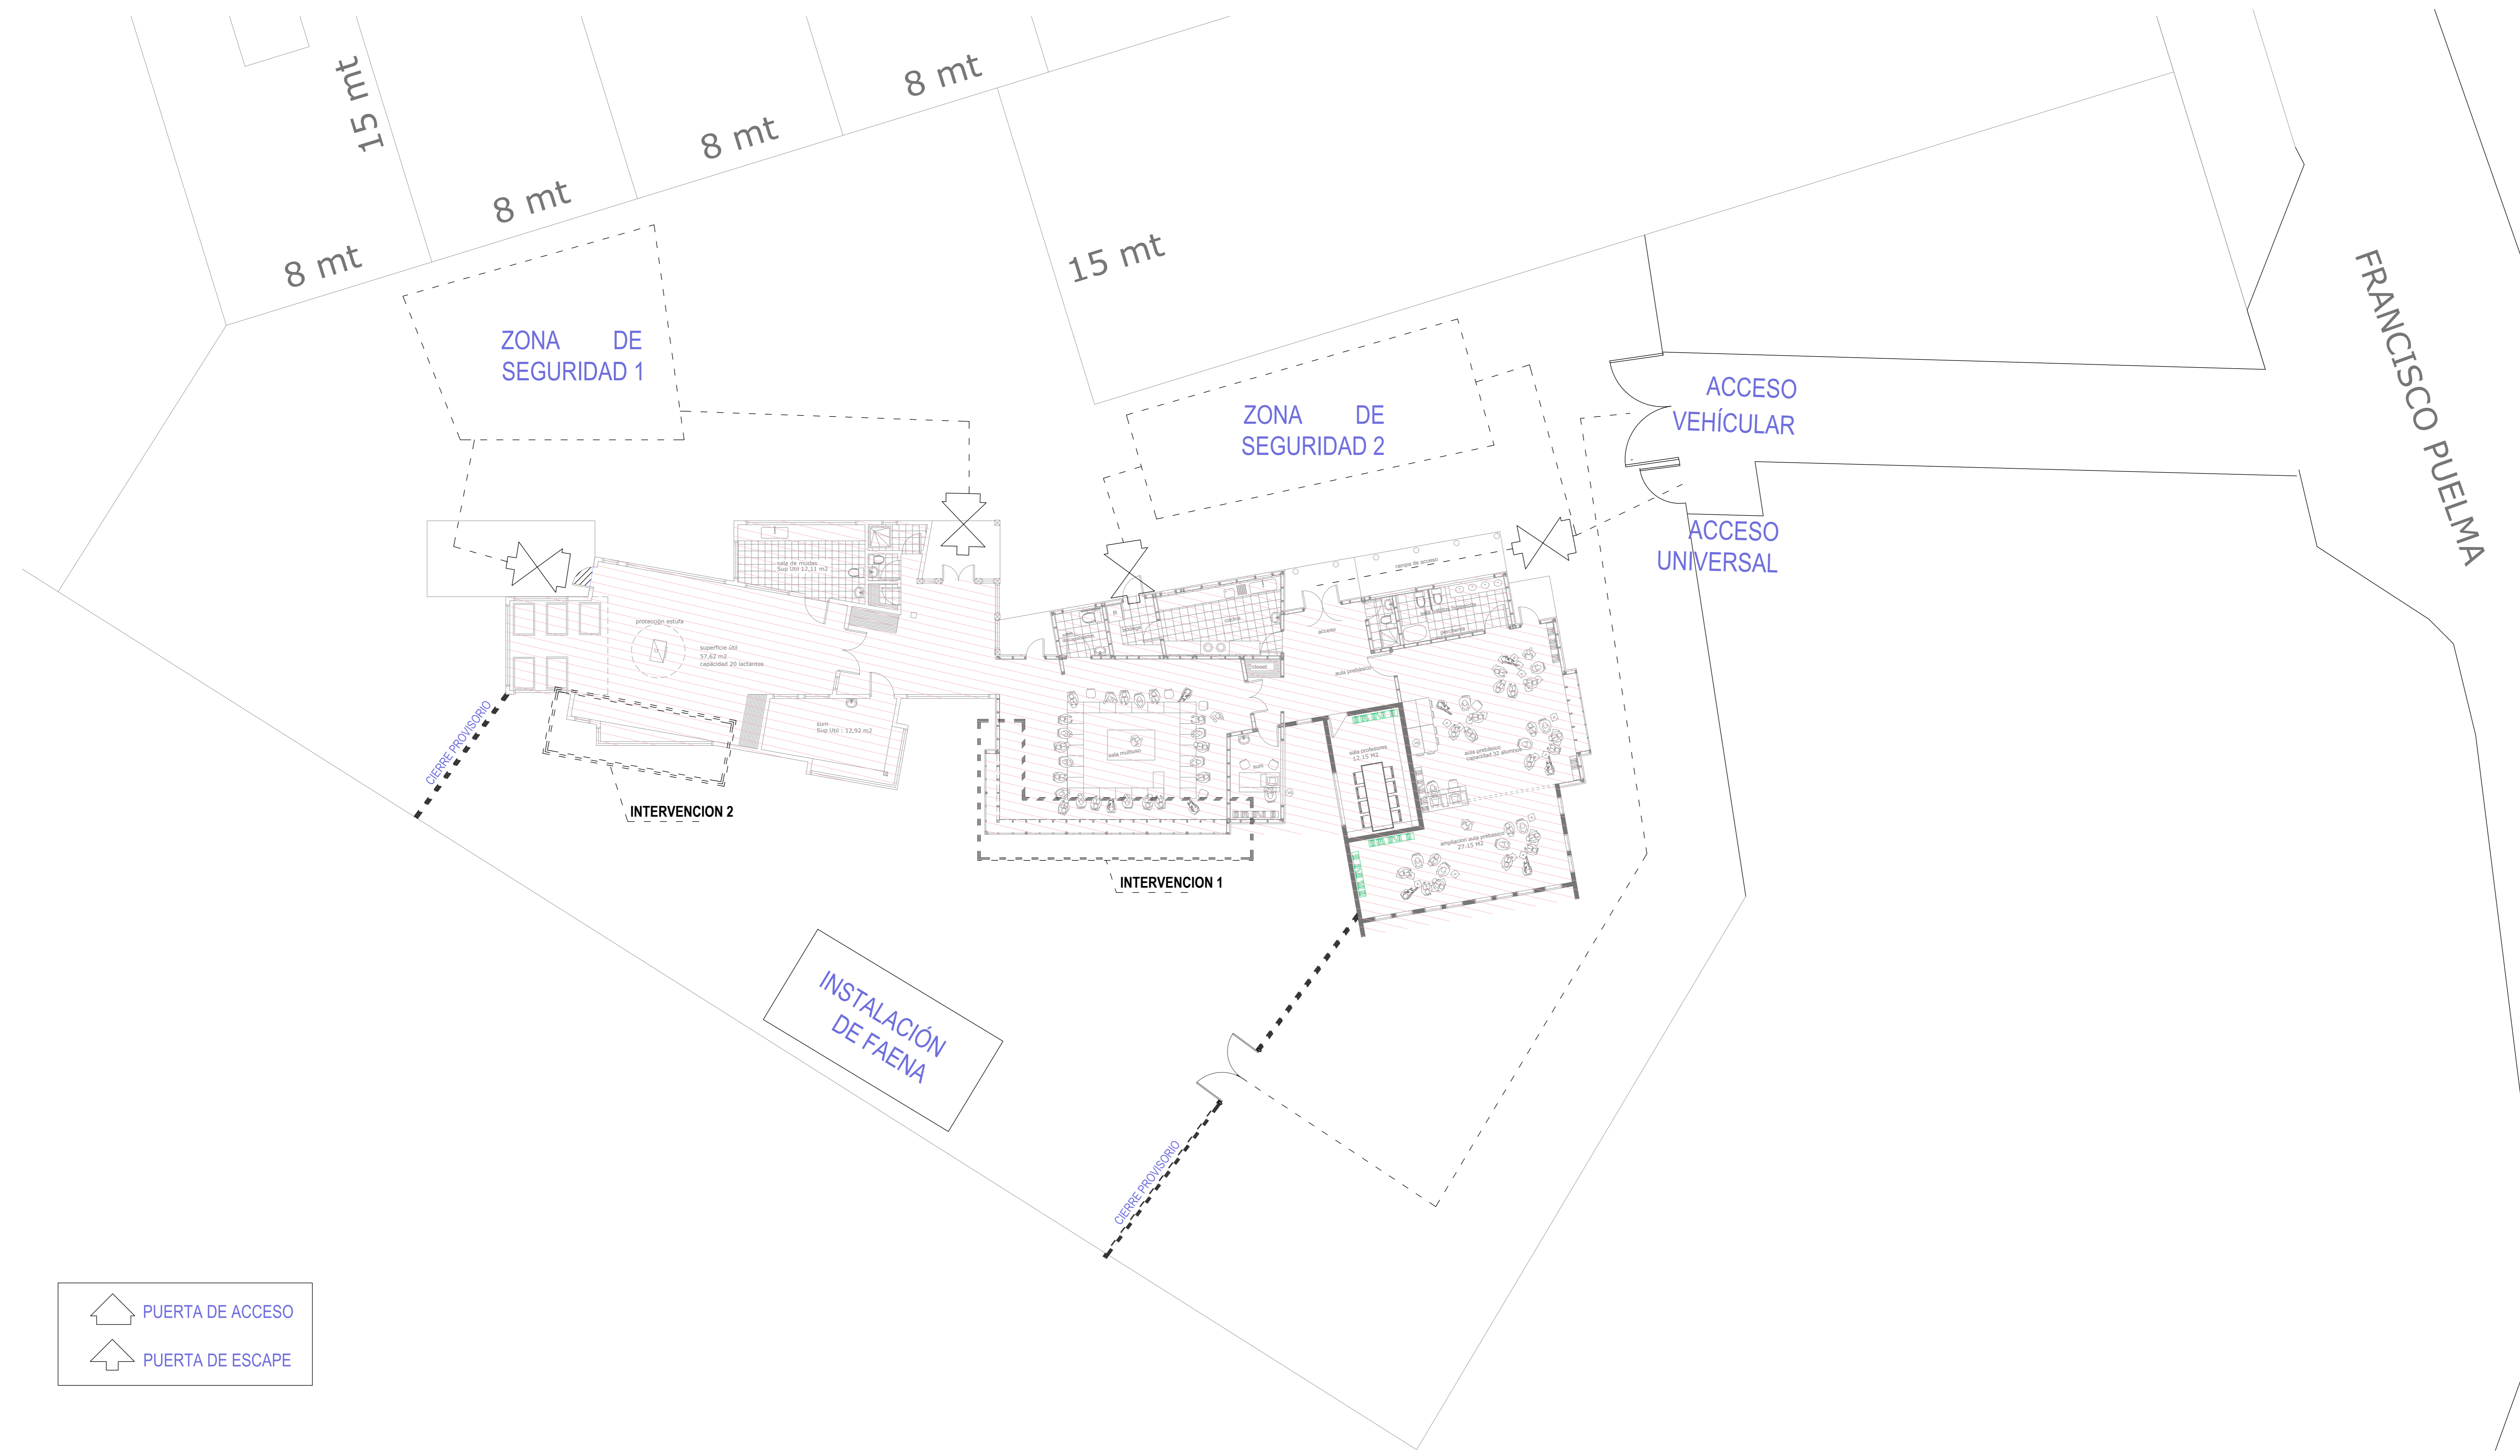

Corporación Municipal de Ancud
PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR

VILLA ESPERANZA
COMUNA DE ANCUZ

NOTAS
LAS COTAS DEFINIDAS EN PLANOS PREVALECE POR SOBRE EL DIBUJO.
TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER CORROBORADAS EN TERRENO.
DE EXISTIR DIFERENCIAS SE DEBERÁ COMUNICAR AL ARQUITECTO QUIEN RESOLVERÁ EN OBRA.

OBSERVACIONES	FECHA

PROYECTO: CONSERVACION CARDIN INFANTIL CANGREJITOS

UBICACION: FRANCISCO PUELMA # SIN POB. VILLA ESPERANZA COMUNA DE ANCUZ

ROL DE AVANZO:

SUPERFICIE TERRENO: 1885 M2 SUPERFICIE PROYECTO: 339 M2

PROPIETARIO: Corporación Municipal de Ancud RUT:

REPRESENTANTE LEGAL:

ARQUITECTOS:

CONTENIDO LAMINA: PLAN DE CONTINGENCIA

ESCALAS: 1/5 1/25 1/200 1/2000
1/10 1/50 1/500 1/5000
1/20 1/100 1/1000 1/10000

FECHA: JUNIO / 2020 NORTE:

EDICION: A LÁMINA: 1 REVISOR INDEPENDIENTE:

VERSIÓN: 001 FORMATO: A1

CODIGO: CEYB-ARQ-01 FECHA REVISIÓN:

DIBUJANTE: FRANCISCO PEREZ GUEZADA / DANIEL HIDALGO MALDONADO

DIRECCION DE OBRAS DE:

ARQUITECTO REVISOR:
