


PLANTA PLAN DE CONTINGENCIA  
PERIODO DICIEMBRE


ESCALA 1/200

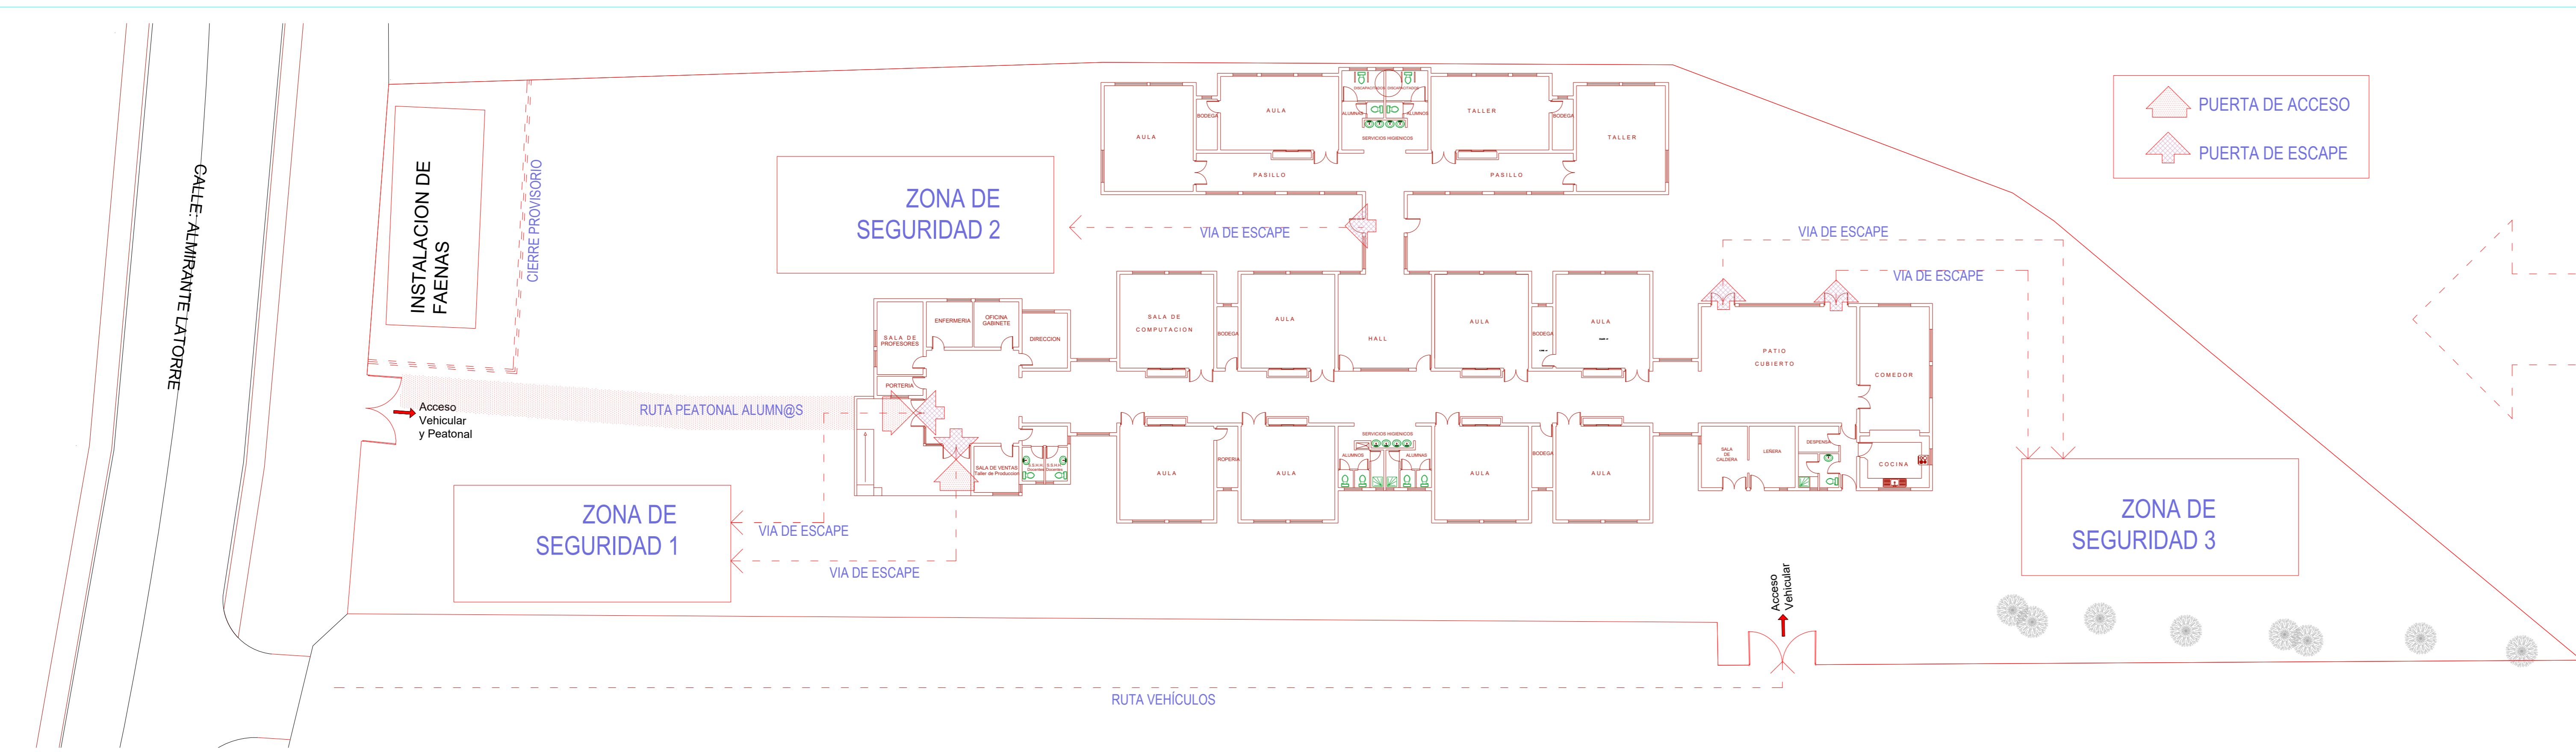

MES	% DE AVANCE OBRA	JORNADA CLASES LICEO	JORNADA TRABAJO EMPRESA CONTRAT.	NOMBRE PARTIDA
Diciembre 2020	20%	Lunes a Viernes 8:00 a 17:30	Lunes a Viernes 18:00 a 22:00	1.7.1. INSTALACION DE FAENAS Y DEPEN 1.7.2. LETRERO DE OBRA 3.1. DESARME Y RETIRO DE CANALETAS Y BAJA AGUAS LUVIAS 3.2. REPOSICION DE CANALES DE AGUAS LUVI 3.3. REPOSICION DE BAJADAS DE AGUAS LUVI 3.4. REPOSICION ALERO 9.1 SELLO FIACIONES 10.3.1 ENCHUFES 10.3.2 INTERRUPTORES 10.2.3 TAPAS CAJAS DE DERIVACION 12 REVESTIMIENTO PAVIMENTO HALL

PLANTA PLAN DE CONTINGENCIA  
PERIODO ENERO Y FEBRERO

ESCALA 1/200

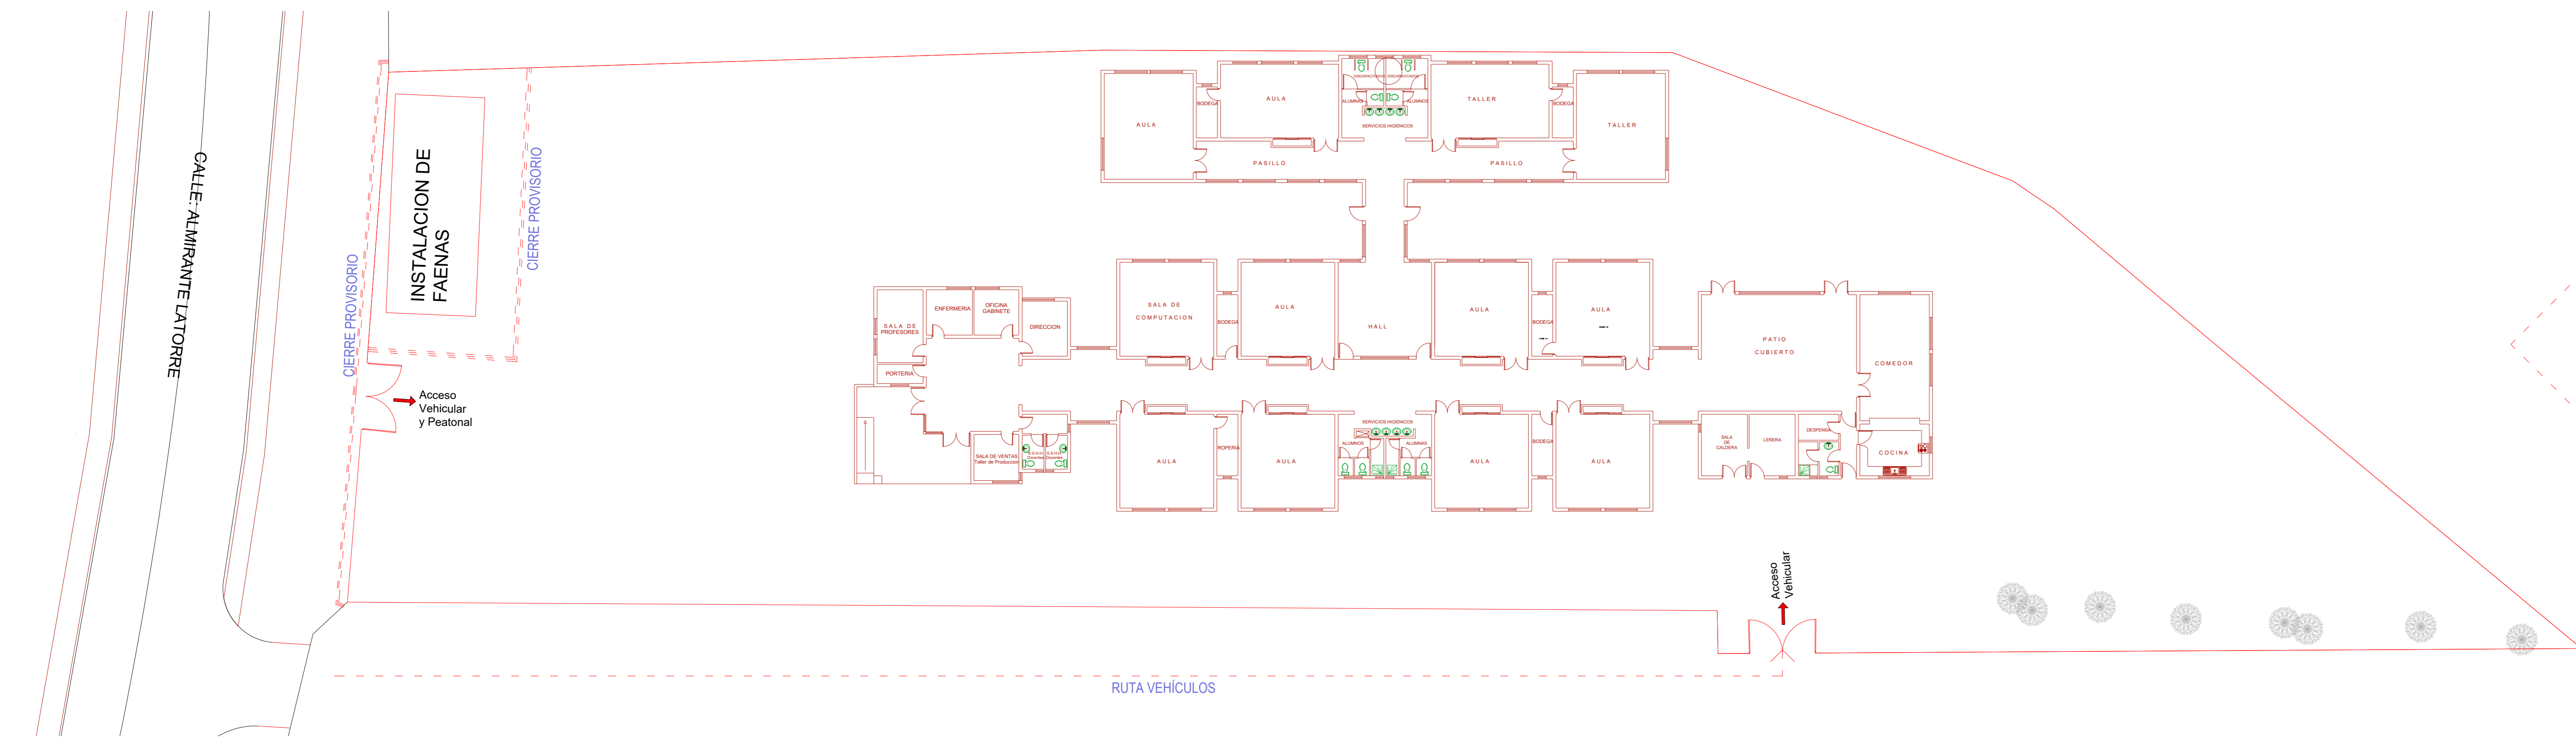

Enero 2021	40%	Vacaciones	Según jornada laboral	2.1 REPOSICION BOMBAS CENTRIFUGA/ RECIRCULACION 2.2 REPOSICION CIRCUITO DE TUBERIA INTER LA CALDERA A LEÑA 2.3 REPOSICION PURGADORES DE AIRE 2.4 REPOSICION VALVULAS 2.5 TERMOMETRO TERMICO 2.6 REPOSICION VALVULAS RETENCION 2.7 MANTENCION CONTROL ELECTRICO CALDERA 2.8 MANTENCION CALDERA A LEÑA 2.9 REPOSICION REVESTIMIENTO CIELO 4.1 DESARME Y RETIRO VENTANAS 4.2 MEJORAMIENTOS VANDOS DE PVC TERMO-PANEL 6.1 REPOSICION WC 6.2 WC UNIVERSAL 6.3 MEJORAMIENTO REVESTIMIENTO INTERI SERVICIOS HIGIENICOS 6.4 REPOSICION CUBICULOS WC 10.1 EQUIPOS DE ILUMINACION ESTANCOS 10.2 EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA TIPO LED 5 CONSERVACION PUERTAS EXTERIOR INTERIORES 5.1 REPOSICION DE PUERTA EXTERIOR CON ANTIPANICO 5.2 CIERRA PUERTA HIDRAULICO 5.3 CERRAJOURAS 7 PINTURAS INTERIORES 7.1 LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIES 7.2 LATEX MUROS INTERIORES 7.3 LATEX BLANCO - CIELOS 7.4 PINTURA FACHADAS EXTERIORES 7.5 PINTURA FACHADAS EXTER REVESTIMIENTO NORTHWAY Y ALEIRO 7.6 REVESTIMIENTO TAPACAN EN PV4 8 IMPERMEABILIZACION MURO
Febrero 2021	30%	Vacaciones	Según jornada laboral	

**Corporación Municipal de Ancud**  
PARA LA EDUCACION, SALUD Y ATENCION AL MENOR


Map showing the location of the school in Ancud, Chile. The map includes the street name CALLE ALMIRANTE LATORRE and the school's location within the town.

**NOTAS**  
LAS COTAS DEFINIDAS EN PLANDS PREVALECN POR SOBRE EL DIBUJO.  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER CORROBORARAS EN TERRENO.  
DE EXISTIR DIFERENCIAS SE DEBERA COMUNICAR AL ARQUITECTO QUIEN RESOLVERA EN OBRA.

OBSERVACIONES	FECHA

PLANTA PLAN DE CONTINGENCIA  
PERIODO MARZO

ESCALA 1/200

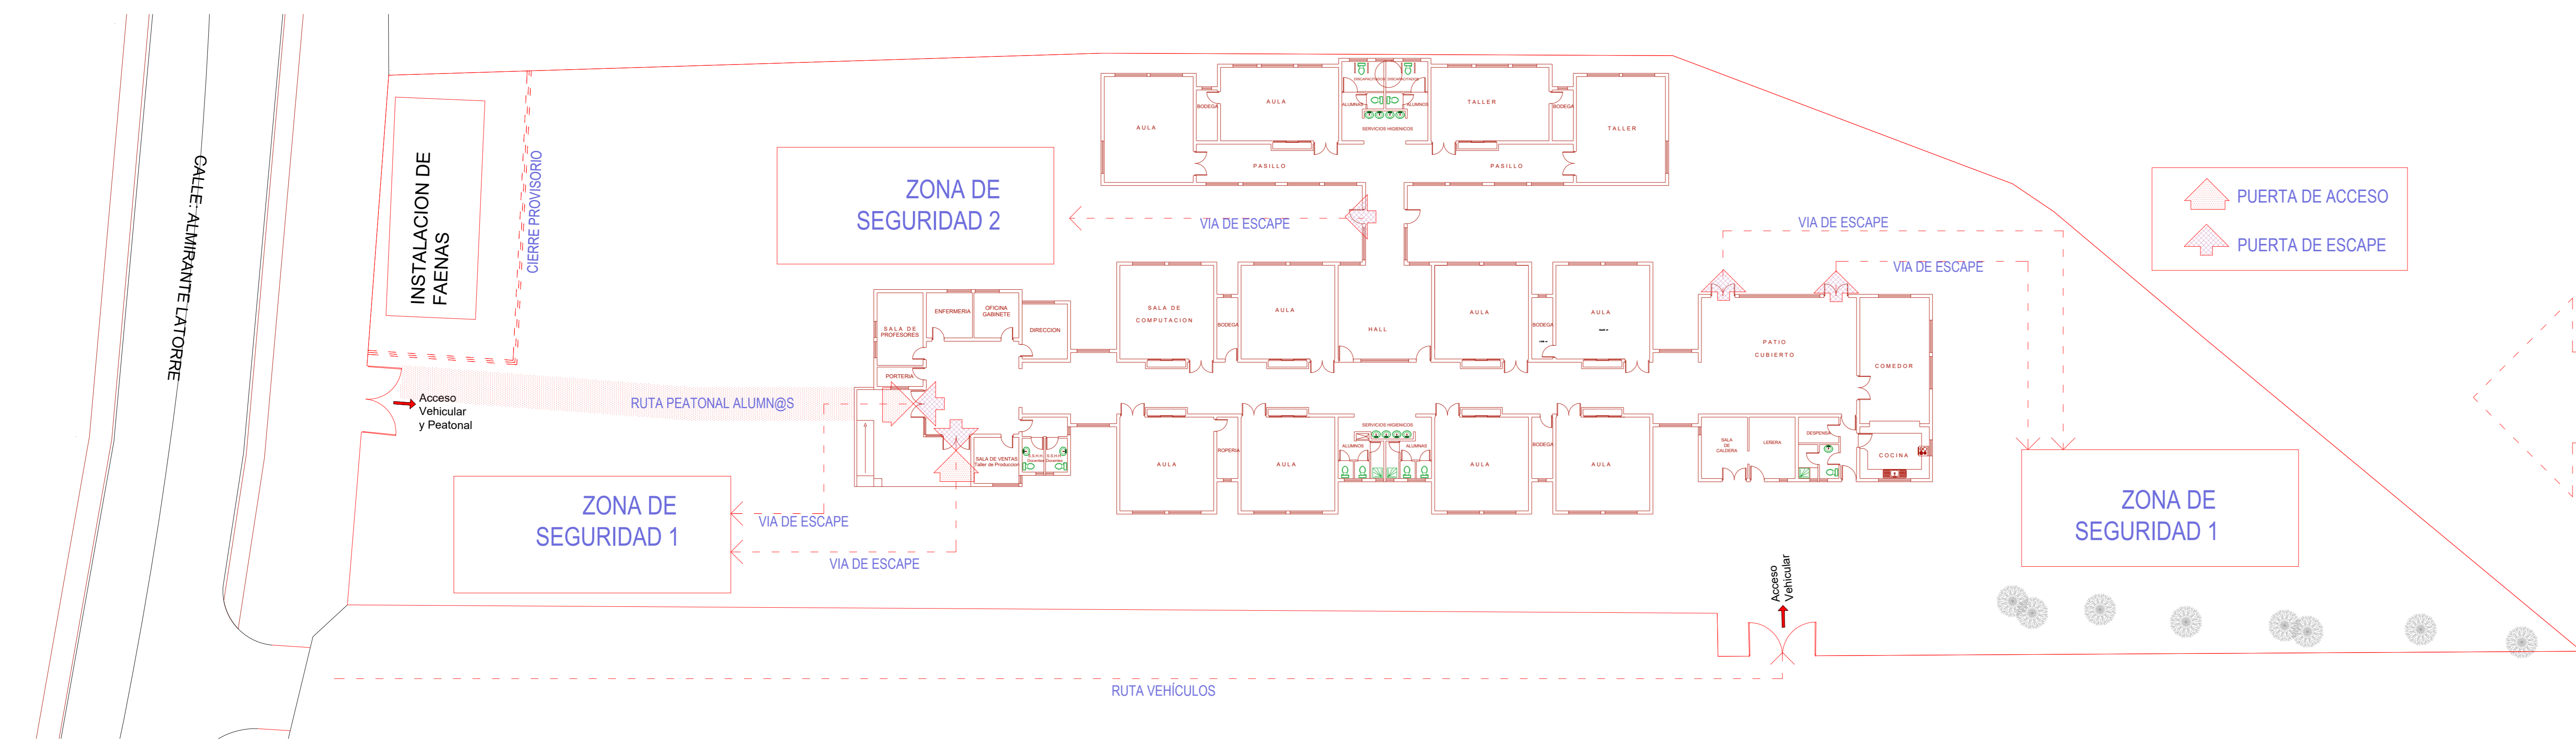

Marzo 2021	10%	Lunes a Viernes 8:00 a 17:30	Lunes a Viernes 18:00 a 22:00	11 CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL 11.1 LIMPIEZA Y PULIDO DE SUPERFICIES 11.2 ESMALE SINTETICO 1.7.3. ASEO DE LA OBRA 1.7.4. ENTREGA FINAL DE LA OBRA
------------	-----	------------------------------	-------------------------------	--

PROYECTO: CONSERVACION ESCUELA DIFERENCIAL SAN CARLOS DE ANCUD

UBICACION: ALMIRANTE LATORRE #580 CILINDRA DE ANCUD

ROL DE AVAISO: 8107 - 8

SUPERFICIE TERRENO: 5000 m2

SUPERFICIE PROYECTO: 1186,00 m2

PROPIETARIO: Corporación Municipal de Ancud

REPRESENTANTE LEGAL: FIRMADO

ARQUITECTO: FRANCISCO PEREZ QUEZADA

CONTENIDO LAMINA: PLAN DE CONTINGENCIA

ESCALA: 1 / 5 1 / 25 1 / 200 1 / 2000 1 / 10 1 / 50 1 / 500 1 / 5000 1 / 20 1 / 100 1 / 1000 1 / 10000

FECHA: MARZO / 2020

EDICION: A

VERSION: 001

CODIGO: 1

CE/DCS-ARG-04

DIRECCION DE OBRAS DE: FRANCISCO PEREZ QUEZADA
